UD1. COMPETENCIAS EMOCIONALES, SOCIALES Y PERSONALES

ACT.6-Gestión de Proyectos

Autores: Nahiomy Caram | Iván Marín | Francella Rojas
Proyecto: NEED IT — Plataforma P2P de Alquiler de Herramientas y Máquinas de Manualidades
Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW 2) — Curso 2025-2026

TABLA DETALLADA DE TAREAS:

Nº	Fase	Tarea / Actividad	Responsable	F. Inicio	F. Fin	Duración	Dep.	% Comp.
1	Inicio	Definición del proyecto y objetivos SMART	Francella	01/10	07/10	7 días	—	100%
2	Inicio	Delimitación de alcance y requisitos P2P	Francella	08/10	14/10	7 días	1	100%
3	Investigación	Análisis de competidores y entorno (Wallapop)	Nahiomy	08/10	17/10	10 días	1	100%
4	Investigación	Estudio de usuarios y catálogo de herramientas	Iván	15/10	24/10	10 días	2	100%
5	Planificación	Definición de arquitectura y modelo BD (PostgreSQL)	Francella	18/10	31/10	14 días	3, 4	100%
6	Planificación	Diseño UI/UX, Wireframes y Mockups (Figma)	Nahiomy	22/10	07/11	17 días	3	100%
7	Planificación	Entorno técnico, Git y presupuesto económico	Iván	25/10	31/10	7 días	4	100%
8	Desarrollo	API Backend: Autenticación, JWT y Usuarios	Iván	01/11	18/11	18 días	5, 7	100%
9	Desarrollo	Frontend: Maquetación base, rutas y guardas	Nahiomy	01/11	18/11	18 días	6, 7	100%
10	Desarrollo	API Backend: Catálogo y sistema de alquiler	Iván / Franc.	19/11	10/12	22 días	8	85%
11	Desarrollo	Frontend: Catálogo, buscador y fichas detalle	Nahiomy	19/11	10/12	22 días	9	80%
12	Desarrollo	Módulo de gestión de reservas, fechas y fianzas	Franc. / Iván	01/12	19/12	19 días	10, 11	60%
13	Desarrollo	Panel de usuario, mis alquileres y reseñas	Nahiomy	11/12	23/12	13 días	11	40%
14	Desarrollo	Testing unitario, pruebas de integración y QA	Francella	15/12	09/01	26 días	12, 13	20%
15	Desarrollo	Despliegue Cloud (Vercel, Railway, PostgreSQL)	Iván	05/01	16/01	12 días	14	0%
16	Análisis	Auditoría de rendimiento (Lighthouse), SEO y QA	Franc. / Nah.	10/01	20/01	11 días	14, 15	0%
17	Elaboración	Redacción de la memoria técnica y manuales	Equipo	15/01	26/01	12 días	15, 16	0%
18	Presentación	Preparación de soporte interactivo y ensayo defensa	Nahiomy / Iván	22/01	29/01	8 días	17	0%
19	Cierre	Control de calidad final, checklist y entrega oficial	Francella	28/01	01/02	5 días	18	0%

DIAGRAMA DE GANTT DETALLADO:


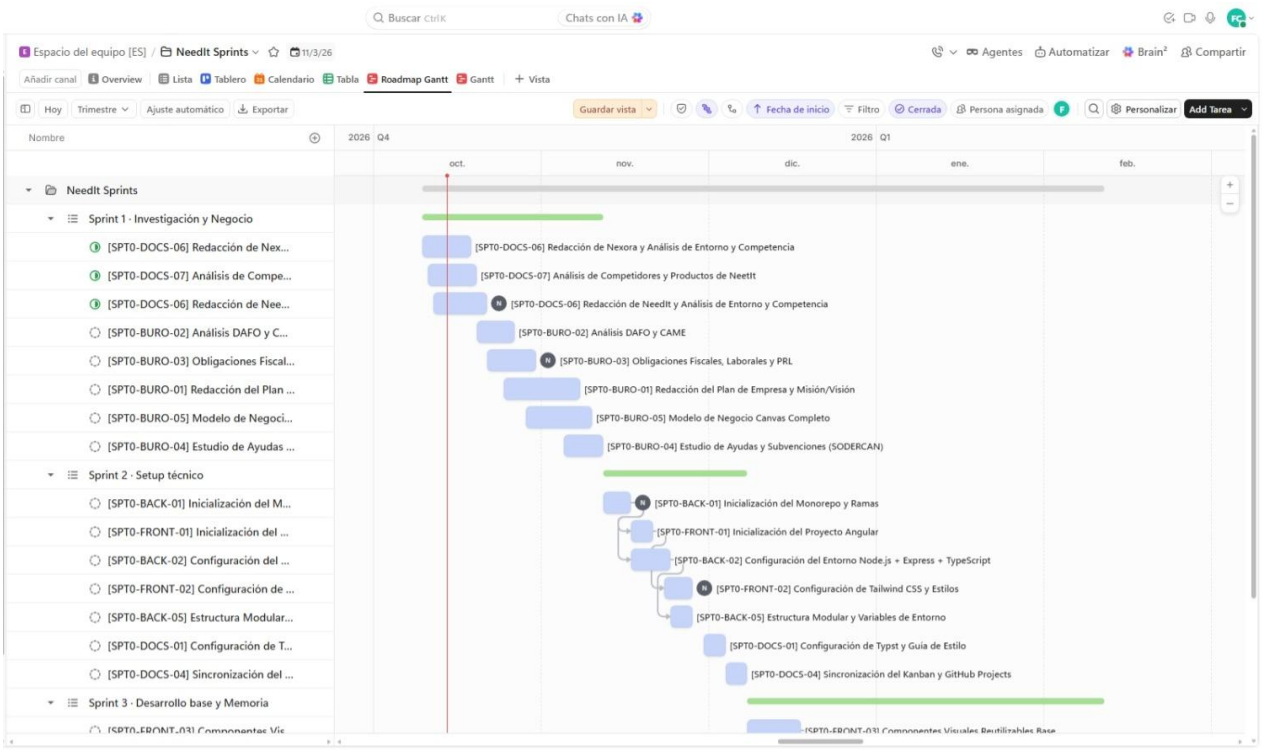


DIAGRAMA DE GANTT AMPLIADO



PROYECTO KANVAN, en GitHub

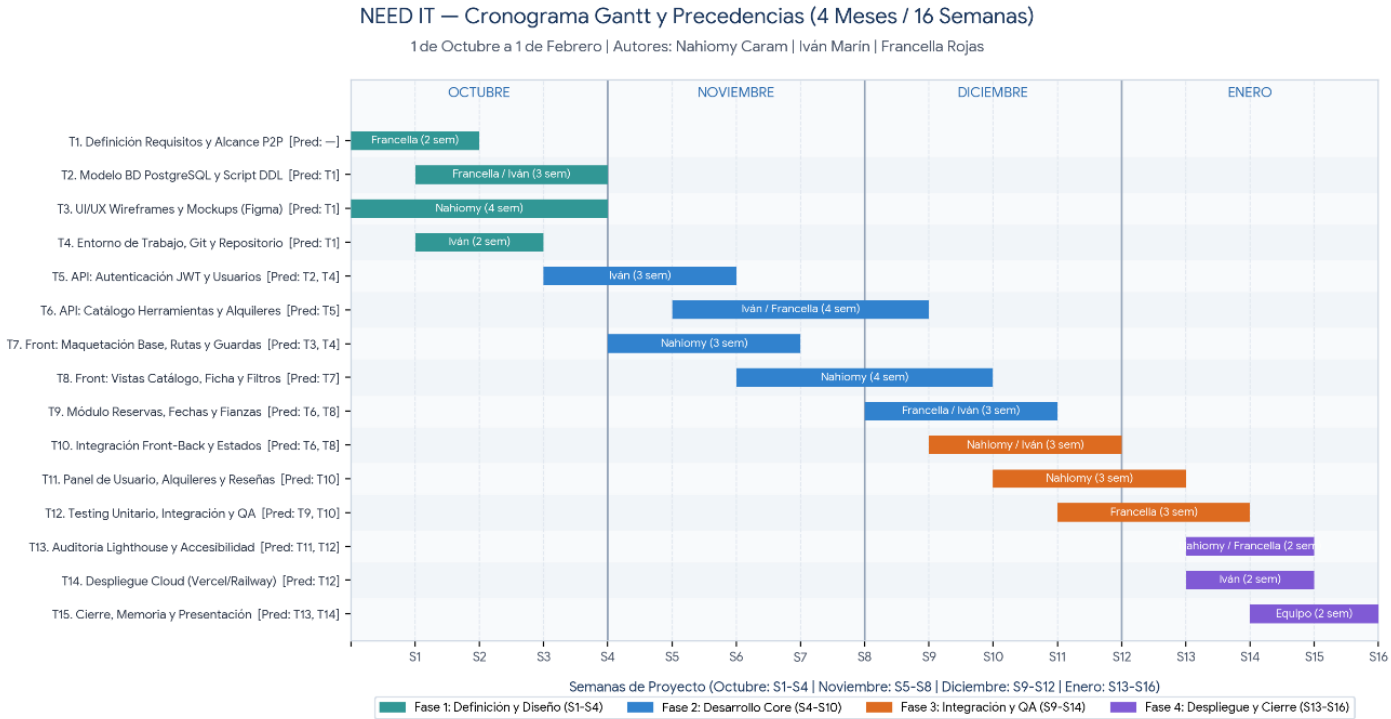
